


**Stavební výbor obce Lhota pod Libčany**



# **Bezbariérový vstup**

**investiční záměr pro bezbariérový vstup do objektu  
zdravotního střediska a pošty**

**zpracován 15.2.2015**

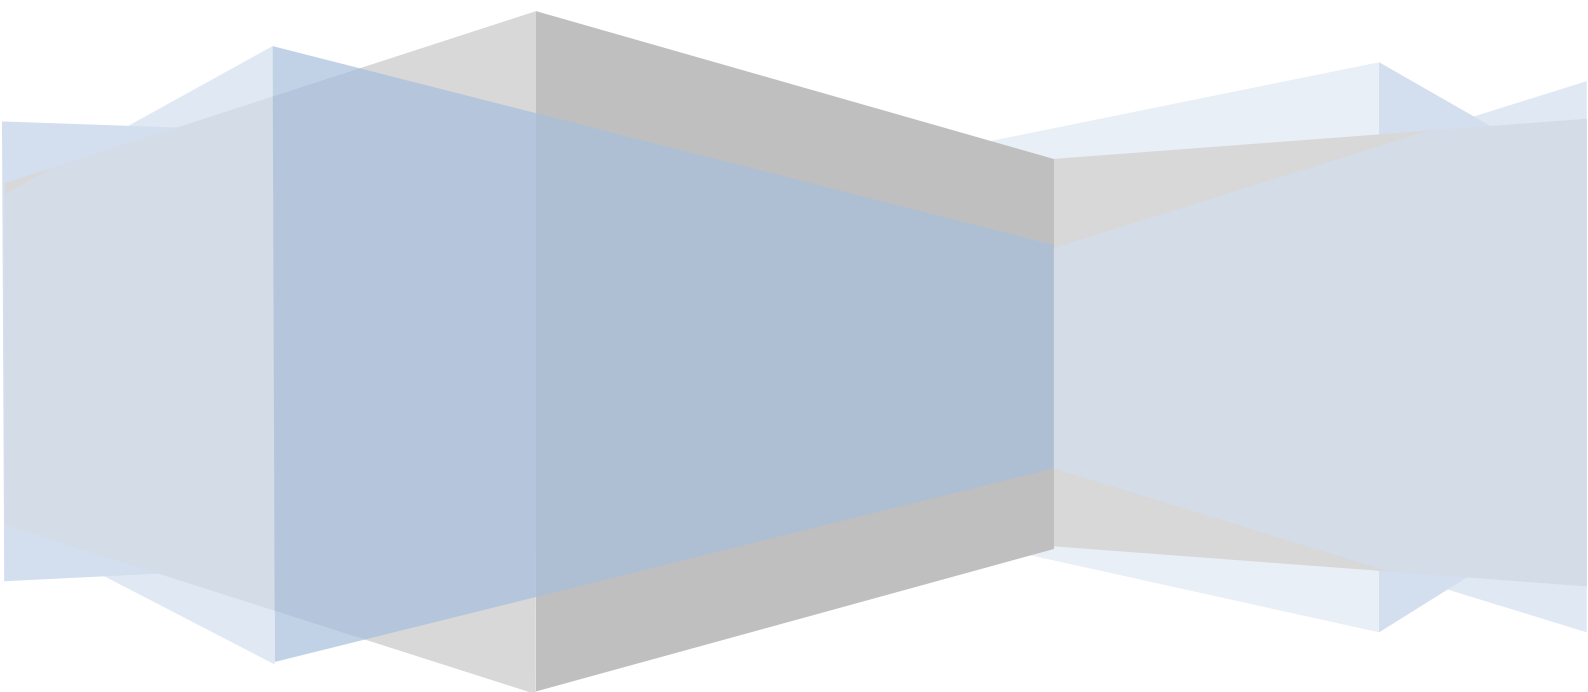

Bezbariérový vstup do budovy zdravotního střediska a pošty, bude řešen lomenou nájezdovou tří ramennou rampou z pororoštu mezi stávajícím vstupem k ordinacím lékařů a poštou podél vnějšího pláště budovy. V centrální části rampy bude vodorovná podesta o rozměrech 1,5 x 4 m. Celková délka nájezdové rampy bude 19 m, včetně podesty. Šíře rampy bude 2 m, minimálně však 1,5 m. Betonovány budou pouze kotvící patky rampy. Prostor pod rampou bude vysypán kačirkem. Poroštové díly budou se zinkovanou povrchovou úpravou bránící korozi. Zábradlí bude ocelové v designu stávajícího zábradlí, které je v závětrří na poštu.

Součástí realizace bezbariérového vstupu bude rekonstrukce schodišť do zdravotního střediska a na poštu, které nevyhovuje platným normám.

### Situační nákres



### Příklad realizace z pororoštu



### Odhadovaná výše investičních nákladů

Projektová příprava a zpracování projektové dokumentace	20 000 Kč
Nájezdová rampa z pororoštu zinkovaná	80 000 Kč
Nosná konstrukce rampy	40 000 Kč
Betonový základ rampy	20 000 Kč
Rekonstrukce schodiště	50 000 Kč
Zábradlí	50 000 Kč
<b>Celkem</b>	<b>260 000 Kč</b>

### Hrubý harmonogram projektu

<b>Datum dokončení</b>	<b>Etapa</b>
28.2 2015	Projektová příprava
31.3.2015	Projektová dokumentace pro stavební povolení
31.7.2015	Stavební povolení
31.9.2015	Realizace stavby
